

Baustellenjournal

ÜK B

Nachname: **BEISPIEL** Vorname: **MAX**

Lehrbetrieb: **ARCHITEKTUR-
BÜRO BEISPIEL**

Projekt: WH PLATZHALTER			
Datum: 02.09.24	KW: 36	Zeit: 07:30-17:00	Temp. 19 °C

	☒				Mo. ☒	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.
---	-------------------------------------	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Firma: MALER MUSTER AG	Arbeiten: MALER BKP 227
-------------------------------	--------------------------------

Beschrieb:

ZUSCHNEIDEN UND VERKLEBEN VON DÄMMUNG



AUF DIE FENSTERRÄHMEN
AUSSEN WURDE STEIN-
WOLLDÄMMUNG IN
SCHMALE STREIFEN
GESCHNITTEN UND
AUFGEBRACHT SO DASS,
DIE RÄHMEN BÜNDIG
MIT DEM MAUERWERK
SIND.

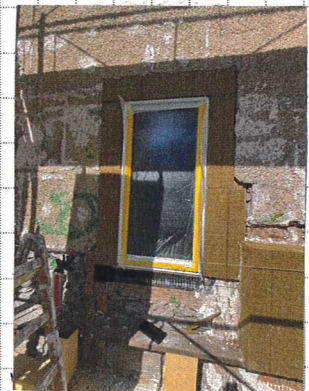

DIE STEINWOLLDÄMMPLATTEN WERDEN IN
STANDART GRÖSSEN GELIEFERT. FÜR AUS-
SPARUNGEN WIE FENSTER UND TÜREN
WERDEN DIESE VOR ORT ZUGESCHNITTEN.

Abgabe an Kurskommission am ÜK 6



DER KLEBESPACHTEL WIRD VOLLFLÄCHIG VERSTRICHEN UND AM RANDE GEHÄUFT AUFGEBRACHT. ZUSÄTZLICH WURDE NOCH KLEBESCHAUM PUNKTUELL AUFGETRAGEN.



WICHTIG: MÜSSEN GUT ANGEDRUCKT WERDEN UND MIT EINER WASSERWAAGE KONTROLLIERT WERDEN.

SOCKELDETAIL

